

ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА АВТОМОБІЛЬНІЙ ДОРОЗІ Н-01 КИЇВ-ЗНАМ'ЯНКА (км 14+470 – км 43+345)

в рамках спільного між Україною, ЄІБ та ЄБРР
проекту “Проект покращення транспортно-
експлуатаційного стану автомобільних доріг
на підходах до м. Київ”

ПІДРЯДНИК - ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited
Sirketi (Туреччина)

Вартість контракту (від 03.12.2014) - 47 736 743,58 євро.

Початок робіт - 9.04.2015 р.

Завершення контракту (періоду відповідальності за
дефекти) - квітень 2017 р.

Тип контракту- роботи.

ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД - Louis Berger SAS (Франція)

Вартість контракту - 854 200 євро.

Початок робіт - 9.04.2015 р.

Завершення контракту (періоду відповідальності за дефекти) - жовтень 2017 р.

Тип контракту - консультаційний.

АВТОМОБІЛЬНА ДОРОГА Н01 (автомагістраль


національного значення) Київ-Знам'янка,
розпочинається в місті Києві, проходить через його
південний кордон, проходить правобережжям

Дніпра до Знам'янки. Категорія - 1.

ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА ДІЛЯНКИ, що підлягає

капітальному ремонту (включає роботи по дорогах,
мостах, інженерних комунікаціях і допоміжні роботи)

складає **28,6 км**.

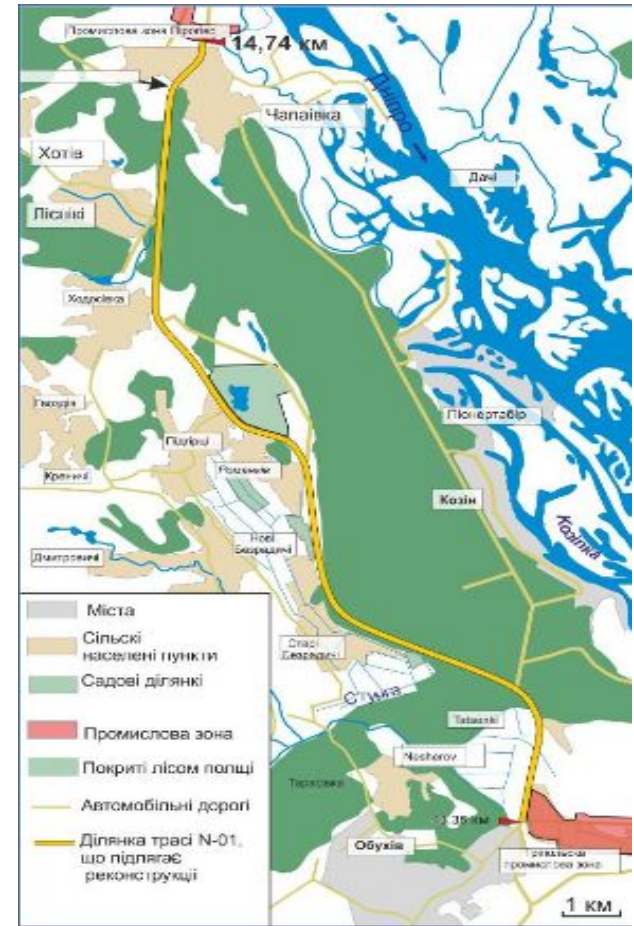

Стан виконання робіт за контрактом на 30.10

Розробка рослинного ґрунту - 9,4 тис.м3 - 19,4 %

Розробка ґрунту загального характеру - 11,0 тис.м3 - 27,2 %

Відсіпка насипу - 6,7 тис.м3 - 5,2 % Загальне фрезерування - 126,7 тис.м2 - 26,5%

Руйнування цементобетонного покриття - 92,9тис.м2 - 31,7% Влаштування основи із ЩПС С-5 - 90,6 тис.м2- 46,8%

Влаштування основи із ЩПС С-7 - 85,6 тис.м2- 39,3%

Влаштування основи із ресайклінгового матеріалу - 36,4тис.м2 - 14,7%.

Влаштування основи із асфальтобетона - 85,8тис. м2- 13,5%

Влаштування зв'язуючого шару із дрібнозернистого асфальтобетона - 40,1 тис. м2- 9,8%

Влаштування зв'язуючого шару із крупнозернистого асфальтобетона - 32,7 тис. м2- 9,9%

Фінансові показники проекту станом на 30.10

Тип фінансування - кредит, ЄБРР, ЄІБ.

Відсоток вибірки - 11,8.

Стан вибірки за контрактом - 5 626 383,50 євро.
