

ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА АВТОМОБІЛЬНІЙ ДОРОЗІ Н-01 КИЇВ-ЗНАМ'ЯНКА (км 14+470 – км 43+345)

в рамках спільного між Україною, ЄІБ та ЄБРР
проекту “Проект покращення транспортно-
експлуатаційного стану автомобільних доріг
на підходах до м. Київ”

ПІДРЯДНИК - ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited
Sirketi (Туреччина)

Вартість контракту (від 03.12.2014) - 47 736 743,58 євро.

Початок робіт - 9.04.2015 р.

Завершення контракту (періоду відповідальності за
дефекти) - квітень 2017 р.

Тип контракту- роботи.

ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД - Louis Berger SAS (Франція)

Вартість контракту - 854 200 євро.

Початок робіт - 9.04.2015 р.

Завершення контракту (періоду відповідальності за дефекти) - жовтень 2017 р.


Тип контракту - консультаційний.

АВТОМОБІЛЬНА ДОРОГА Н01 (автомагістраль

національного значення) Київ-Знам'янка,
розпочинається в місті Києві, проходить через його
південний кордон, проходить правобережжям
Дніпра до Знам'янки. Категорія - 1.

ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА ДІЛЯНКИ, що підлягає

капітальному ремонту (включає роботи по дорогах,
мостах, інженерних комунікаціях і допоміжні роботи)
складає **28,6 км**.

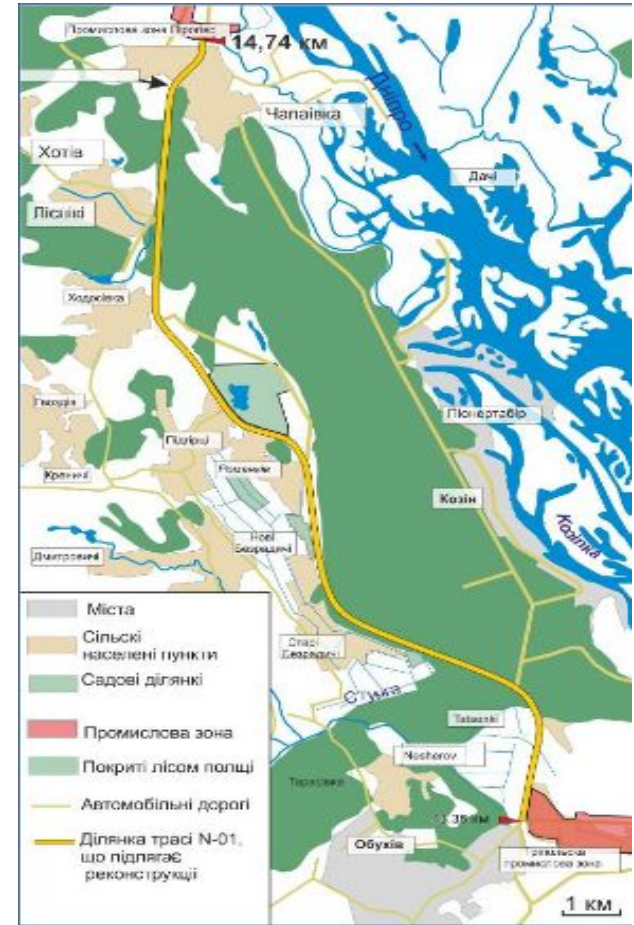

Стан виконання робіт за контрактом на 18.09

Розробка рослинного ґрунту-17,0 % Розробка ґрунту загального характеру -16,3 %

Загальне фрезерування - 16,4%

Руйнування цементобетонного покриття - 12,6%

Влаштування основи із ЩПС С-5 - 16,4% Влаштування основи із ЩПС С-7 - 10,0%

Влаштування основи із ресайклінгового матеріалу - 9,8%

Влаштування основи із асфальтобетона - 6,4%

Влаштування зв'язуючого шару із дрібнозернистого асфальтобетона - 4,8%.

Влаштування зв'язуючого шару із крупнозернистого асфальтобетона - 6,1%.

Стан виконання робіт за контрактом на 02.10

Розробка рослинного ґрунту - 17,0 %.

Розробка ґрунту загального характеру - 17,1 %. Загальне фрезерування - 18,6 %.

Руйнування цементобетонного покриття - 19,1 %.

Влаштування основи із ЩПС С-5 - 21,9 %. Влаштування основи із ЩПС С-7 - 16,1 %.

Влаштування основи із ресайклінгового матеріалу - 14,7 %.

Влаштування основи із асфальтобетона - 6,4%.

Влаштування зв'язуючого шару із дрібнозернистого асфальтобетона - 4,8%.

Влаштування зв'язуючого шару із крупнозернистого асфальтобетона - 6,1%.

Фінансові показники проекту станом на 18.09, 2.10

Тип фінансування - кредит, ЄБРР, ЄІБ.

Відсоток вибірки - 11,8.

Стан вибірки за контрактом - 5 626 383,50 євро.
